



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 502201914003405

Nome original: P01 - RDS - Módulo Principal - 201904.pdf

Data: 01/05/2019 22:15:20

Remetente:

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN

Coordenadoria de Governança e Projetos

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta ao ofício CSJT.CGGOV No. 19 de 12 de abril de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Módulo Principal do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho - SIGEP	Código:	
Gerente do Projeto:	Oswaldo José Costa da Silva Leme	Telefone:	(11) 3150-2076 (11) 97590-8294
E-mail:	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Paulo Peralta		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/04/2019
Período de Abrangência – Início:	01/04/2019
Período de Abrangência – Fim:	30/04/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Apoiar a Instalação	10	100%	10%
2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	20	83,13%	16,63%
3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	15	100%	15%
4	Construir Módulo Principal	15	100%	15%
5	Incluir Mecanismo de Auditoria	15	100%	15%
6	Evoluir Módulo de Lotação	5	100%	5%
7	Integrar Pasta Funcional Eletrônica	5	100%	5%
8	Estabilizar Módulo Principal	15	100%	15%
			Total	96,63%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Apoiar a Instalação	31/12/2017	31/12/2017	30/06/2018	130
1.3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	31/12/2017	31/12/2017	31/07/2018	152
1.4	Construir Módulo Principal	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0
1.5	Incluir Mecanismo de Auditoria	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0
1.6	Evoluir Módulo de Lotação	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0
1.7	Incluir Pasta Funcional Eletrônica	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0
1.8	Estabilizar Módulo Principal	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	0

4.2. Tarefas em Atraso

Não há.

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1,2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	83,13	31/12/2019	176	Sim


5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Apoio a Implantação nos Regionais	Indisponibilidade e das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Finalizado
2	Integração dos módulos	Atraso no Cronograma	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Finalizado
3	Estabilização do Módulo Principal	Descontinuidade da versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco Provável	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
4	Estabilização do Módulo Principal	Incompatibilidade e do sistema operacional dos microcomputadores em relação a versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
5	Ajustes do Módulo Principal decorrentes do Projeto de implantação do eSocial JT	Atraso no Cronograma	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Alerta

6. OBSERVAÇÕES

Implantações SIGEP-JT nos Regionais *

Módulo	Situação					
	Em Produção	Em Paralelo / Homologando	Homologado	Migrado	Instalado	Não instalado
Principal	5	12	2	3	2	0
EJUD	2	1	2	1	13	5
PROGECOM	1	0	1	1	13	8
Conector	0	1	1	0	6	16
FolhaWeb	1	17	0	3	2	1

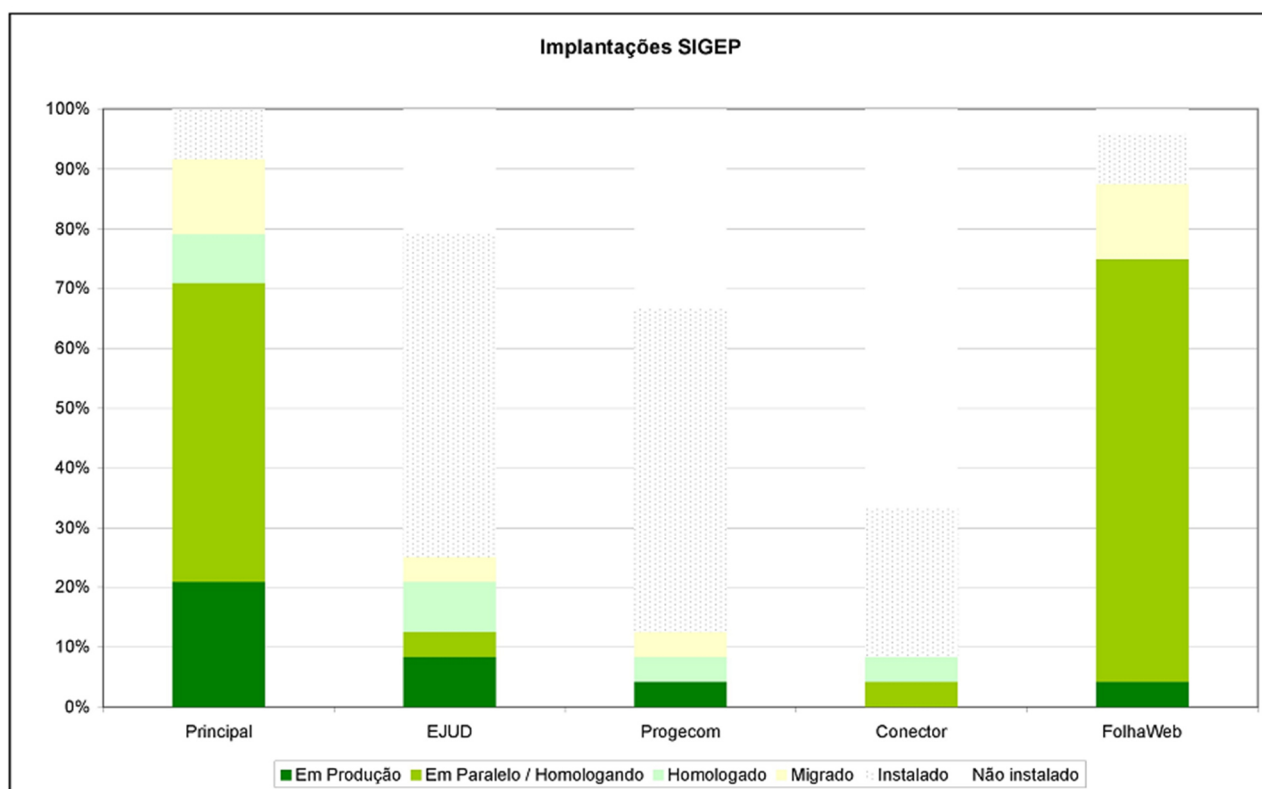

(*) dados de dezembro 2018

Está em elaboração mecanismo automatizado de levantamento das informações referentes as implantações dos módulos nos Regionais.
